



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend. Soeharto Km. 05 Kalierang Selomerto Wonosobo
WONOSOBO

LAPORAN BULANAN

BULAN KE - 1

PERIODE : 27 Oktober 2021 - 31 Oktober 2021

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN :

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)

NO. KONTRAK	:	050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021
TANGGAL KONTRAK	:	27 Oktober 2021
NO. SPMK	:	050/02445/PPK-SDA/DPUPR/2021
TANGGAL SPMK	:	27 Oktober 2021
NILAI KONTRAK	:	Rp 1.971.556.000,00
JANGKA WAKTU	:	27 Oktober 2021 - 25 Desember 2021

PENYEDIA JASA

CV. TONGGAK AMPUH

Jetis Pacarmulyo RT. 04 RW. 06 Kec. Leksono Wonosobo

TAHUN
2021

KEGIATAN	:	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN	:	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)
PENYEDIA JASA	:	CV. TONGGAK AMPUH
PERIODE BL. KE-	:	1
DARI TANGGAL-	:	27 Oktober 2021
S/D TANGGAL-	:	31 Oktober 2021

NO	JENIS MATERIAL	VOL.	SAT	PENGUNAAN			PENYEDIAAN			SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	Batu Belah	1.198,43	M3	-	39,00	39,00	-	50,00	50,00	11,00
2	Kawat Bronjong Pabrikasi	219,75	8h	-	30,00	30,00	-	200,00	200,00	170,00
3	Pasir Pasang	358,69	M3	-	-	-	-	-	-	-
4	Portland Cement (PC)	224.167,00	Kg	-	-	-	-	-	-	-
5	Multiflex 12 mm	280,00	Lbr	-	-	-	-	-	-	-
6	Kaso 5/7 cm	10,79	m3	-	-	-	-	-	-	-
7	Paku 5 cm dan 7 cm	170,40	Kg	-	-	-	-	-	-	-
8	Minyak Bekisting	154,40	Liter	-	-	-	-	-	-	-
9	Pasir Beton	206,43	M3	-	-	-	-	-	-	-
10	Batu Pecah Split 2/3	314,12	M3	-	-	-	-	-	-	-
11	Besi beton polos	2.577,00	Kg	-	-	-	-	-	-	-
12	Kawat beton	36,80	Kg	-	-	-	-	-	-	-
13	Tanah Urug	112,81	M3	-	-	-	-	-	-	-
14	Bagor	85,00	M3	-	-	-	-	-	-	-
15	Pipa PVC AW dia.2"	21,00	M1	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	JUMLAH	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Pekerja	2.207,00 hok	-	25,00	25,00
2	Tukang Batu	668,00 hok	-	-	-
3	Tukang Kayu	83,00 hok	-	-	-
4	Tukang Besi	18,00 hok	-	-	-
5	Kepala Tukang	92,00 hok	-	-	-
6	Mandor	112,00 hok	-	4,00	4,00

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Excavator	63,00 Jam	-	16,00	16,00
2	Jack Hammer	47,00 Jam	-	-	-
3	Compressor	47,00 Jam	-	-	-
4	Concrete Mixer	1.560,00 Jam	-	-	-

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 1	Rabu, 27 Oktober 2021 s.d Minggu, 31 Oktober 2021	.	
		Lamanya hujan bulan ini		
		Lamanya hujan s/d bulan lalu		
		Lamanya hujan s/d bulan ini		

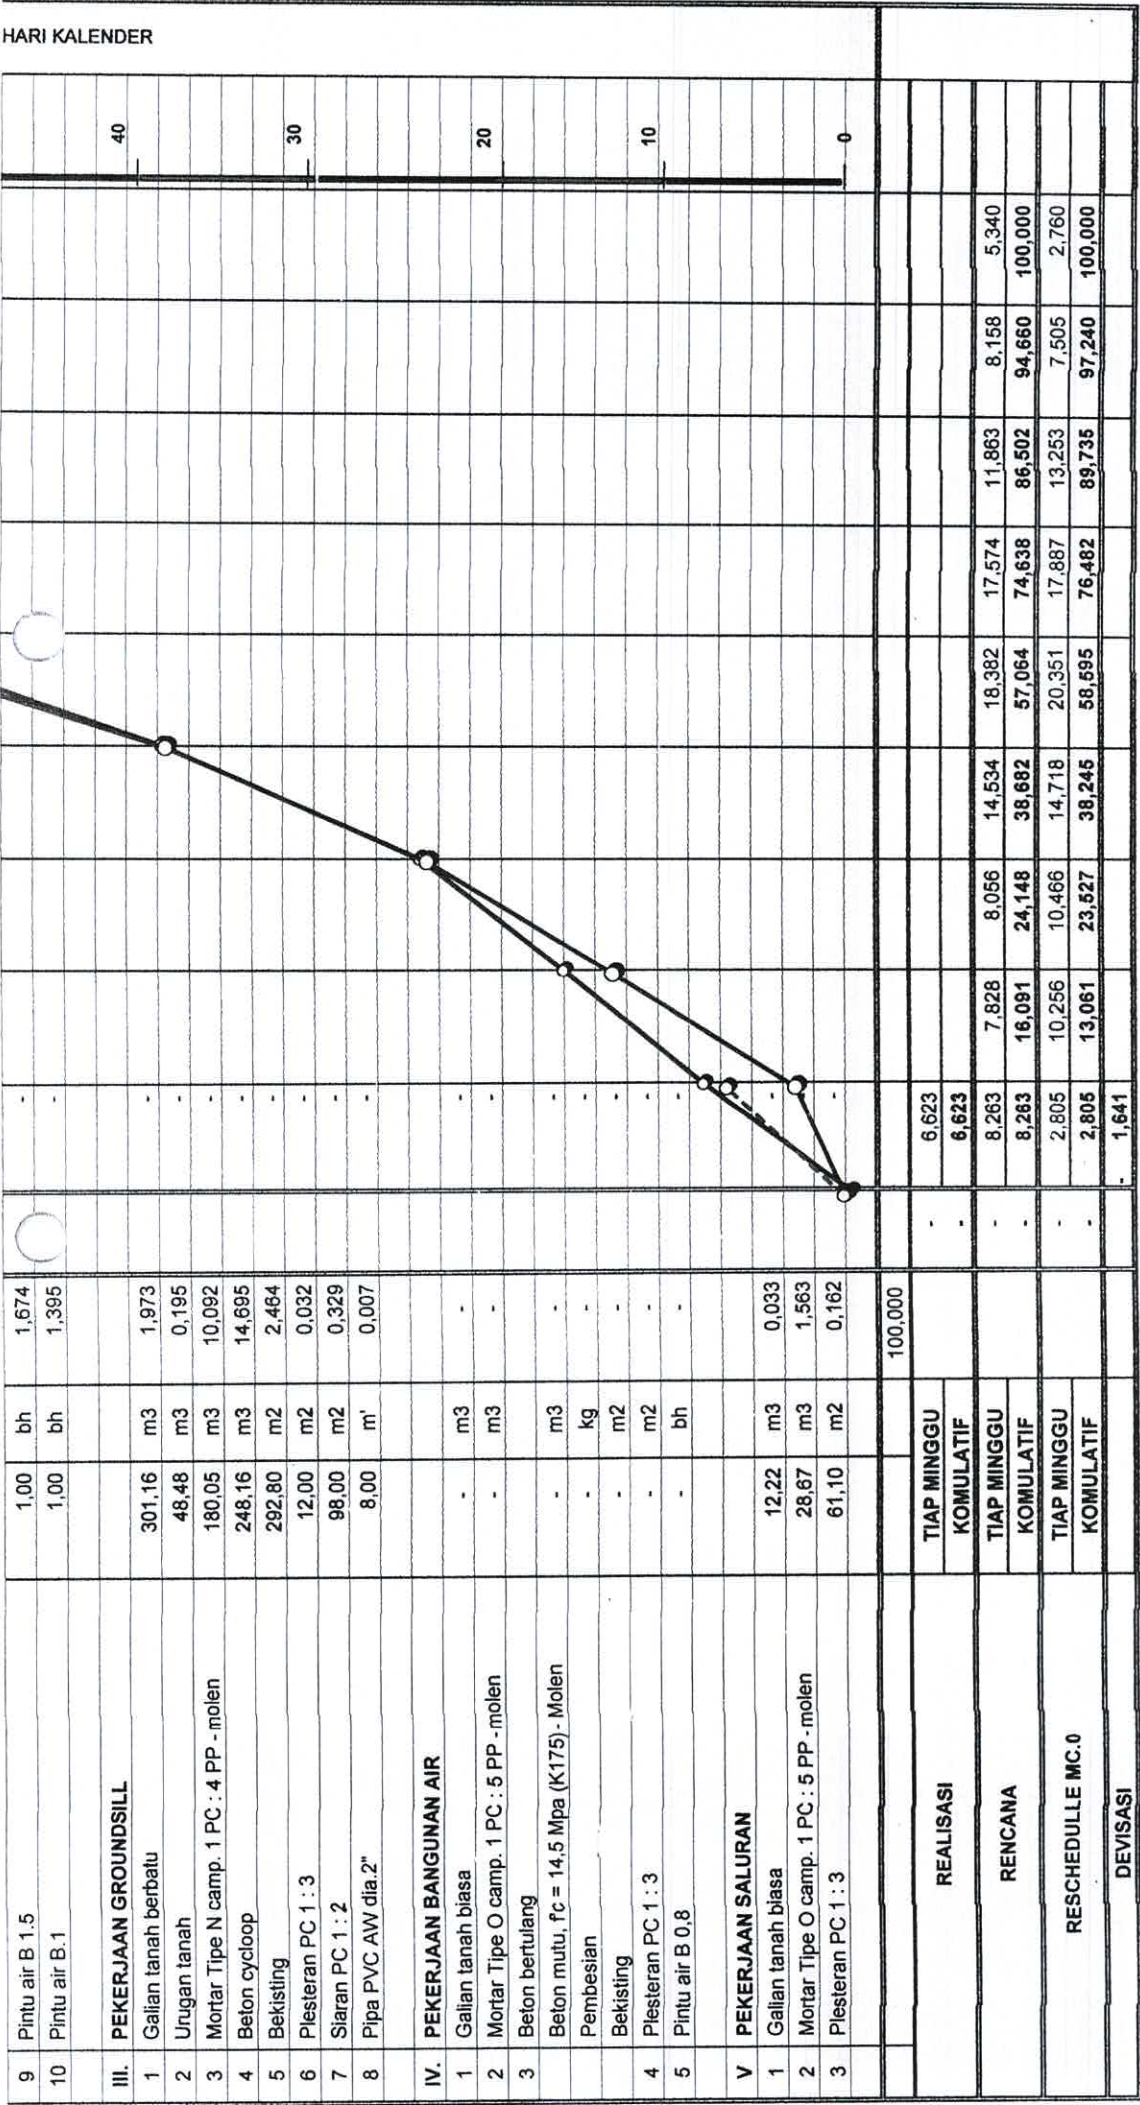
MUHAMMAD WAISUL
Pelaksana

[illegible]

31 Oktober 2021

MASA PEMELIHARAAN = 180

HARI KALENDER



Diperiksa
KONSULTAN PENGAWAS
CV. UTAMA KARYA

Dibuat :
CV. TONGGAK AMPUH

Prasetyo Adhi, ST
Inspector

Muhammad Waisul
Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend. Soeharto Km. 05 Kalierang Selomerto Wonosobo
WONOSOBO

LAPORAN BULANAN BULAN KE - 2

PERIODE : 01 November 2021 - 28 November 2021

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN :

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)

NO. KONTRAK	:	050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021
TANGGAL KONTRAK	:	27 Oktober 2021
NO. SPMK	:	050/02445/PPK-SDA/DPUPR/2021
TANGGAL SPMK	:	27 Oktober 2021
NILAI KONTRAK	:	Rp 1.971.556.000,00
JANGKA WAKTU	:	27 Oktober 2021 - 25 Desember 2021

PENYEDIA JASA

CV. TONGGAK AMPUH

Jetis Pacarmulyo RT. 04 RW. 06 Kec. Leksono Wonosobo

TAHUN
2021

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA
DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)
PENYEDIA JASA : CV. TONGGAK AMPUH
PERIODE BL. KE- : 2
DARI TANGGAL- : 01 November 2021
S/D TANGGAL- : 28 November 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOL.	SAT	PENGGUNAAN			PENYEDIAAN			SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	Batu Belah	1.198,43	M3	39,00	414,96	453,96	50,00	410,00	460,00	6,04
2	Kawat Bronjong Pabrikasi	219,75	Bh	30,00	54,75	84,75	200,00	-	200,00	115,25
3	Pasir Pasang	358,69	M3	-	115,93	115,93	-	140,00	140,00	24,07
4	Portland Cement (PC)	224.167,00	Kg	-	74.842,00	74.842,00	-	85.000,00	85.000,00	10.158,00
5	Multiflex 12 mm	280,00	Lbr	-	88,00	88,00	-	90,00	90,00	2,00
6	Kaso 5/7 cm	10,79	m3	-	3,40	3,40	-	4,00	4,00	0,60
7	Paku 5 cm dan 7 cm	170,40	Kg	-	53,70	53,70	-	55,00	55,00	1,30
8	Minyak Bekisting	154,40	Liter	-	48,60	48,60	-	52,00	52,00	-
9	Pasir Beton	206,43	M3	-	57,38	57,38	-	60,00	60,00	2,62
10	Batu Pecah Split 2/3	314,12	M3	-	87,03	87,03	-	95,00	95,00	7,97
11	Besi beton polos	2.577,00	Kg	-	1.142,00	1.142,00	-	1.500,00	1.500,00	358,00
12	Kawat beton	36,80	Kg	-	16,30	16,30	-	20,00	20,00	3,70
13	Tanah Urug	112,81	M3	-	-	-	-	-	-	-
14	Bagor	85,00	M3	-	-	-	-	-	-	-
15	Pipa PVC AW dia.2"	21,00	M1	-	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Pekerja	2.207,00 hok	25,00	739,00	764,00
2	Tukang Batu	668,00 hok	-	248,00	248,00
3	Tukang Kayu	83,00 hok	-	27,00	27,00
4	Tukang Besi	18,00 hok	-	8,00	8,00
5	Kepala Tukang	92,00 hok	-	36,00	36,00
6	Mandor	112,00 hok	4,00	45,00	49,00

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Excavator	63,00 Jam	16,00	27,00	43,00
2	Jack Hammer	47,00 Jam	-	27,00	27,00
3	Compressor	47,00 Jam	-	27,00	27,00
4	Concrete Mixer	1.560,00 Jam	-	477,00	477,00


IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 2	Senin, 01 November 2021 s.d Minggu, 07 November 2021		
2	MINGGU 3	Senin, 08 November 2021 s.d Minggu, 14 November 2021		
3	MINGGU 4	Senin, 15 November 2021 s.d Minggu, 21 November 2021		
4	MINGGU 5	Senin, 22 November 2021 s.d Minggu, 28 November 2021		
5	MINGGU			
		Lamanya hujan bulan ini		
		Lamanya hujan s/d bulan lalu		
		Lamanya hujan s/d bulan ini		

Wonosobo, 28 November 2021

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. UTAMA KARYA


PRASETYO ADHI ST
Inspectore

Dibuat Oleh :
CV. TONGGAK AMPUH

MUHAMMAD WAISUL
Pelaksana

RELISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

BULAN KE

TANGGAL

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

: PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IIRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IIRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

: REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI D.I DESA MRICA (343)

: KECAMATAN KALIKAJAJAR

: 2

: 01 November 2021

: 80 HARI KALENDER

s/d

28 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	NILAI BOBOT PEK (%)	BLN	OKT.	NOVEMBER							DESEMBER						PROGRES	KET.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							MGG	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	TGL	s/d	s/d			s/d	s/d	s/d	s/d	s/d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																											5	7	7	7	7	7	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																		27/10/2021	01/11/2021	08/11/2021	15/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	20/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

MASA PEMELIHARAAN = 180

HARI KALENDER									
9	Pintu air B 1.5	1,00	bh	1,674					
10	Pintu air B.1	1,00	bh	1,395					
III. PEKERJAAN GROUNDSILL									
1	Galian tanah berbatu	301,16	m3	1,973					
2	Urugan tanah	48,48	m3	0,195					
3	Mortar Tipe N camp. 1 PC : 4 PP - molen	180,05	m3	10,092					
4	Beton cycloop	248,16	m3	14,695					
5	Bekisting	292,80	m2	2,464					
6	Plesteran PC 1 : 3	12,00	m2	0,032					
7	Siaran PC 1 : 2	98,00	m2	0,329					
8	Pipa PVC AW dia.2"	8,00	m'	0,007					
IV. PEKERJAAN BANGUNAN AIR									
1	Galian tanah biasa	-	m3	-					
2	Mortar Tipe O camp. 1 PC : 5 PP - molen	-	m3	-					
3	Beton bertulang	-	m3	-					
	Beton mutu, $f_c = 14,5$ Mpa (K175) - Molen	-	kg	-					
	Pembesian	-	m2	-					
	Bekisting	-	m2	-					
4	Plesteran PC 1 : 3	-	m2	-					
5	Pintu air B 0.8	-	bh	-					
V PEKERJAAN SALURAN									
1	Galian tanah biasa	12,22	m3	0,033					
2	Mortar Tipe O camp. 1 PC : 5 PP - molen	28,67	m3	1,563					
3	Plesteran PC 1 : 3	61,10	m2	0,162					
				100,000					
REALISASI					TIAP MINGGU				
					KOMULATIF				
RENCANA					TIAP MINGGU				
					KOMULATIF				
RESCHEDULE MC.0					TIAP MINGGU				
					KOMULATIF				
DEVISASI									


MUHAMMAD WAISUL
Pelaksana

Diperiksa
KONSULTAN PENGAWAS
CV. UTAMA KARYA


PRASETYO ADHI, ST
Inspector



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend. Soeharto Km. 05 Kalierang Selomerto Wonosobo
WONOSOBO

LAPORAN BULANAN BULAN KE - 3

PERIODE : 29 November 2021 - 22 Desember 2021

KEGIATAN :

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)

NO. KONTRAK	:	050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021
TANGGAL KONTRAK	:	27 Oktober 2021
NO. SPMK	:	050/02445/PPK-SDA/DPUPR/2021
TANGGAL SPMK	:	27 Oktober 2021
NILAI KONTRAK	:	Rp 1.971.556.000,00
JANGKA WAKTU	:	27 Oktober 2021 - 25 Desember 2021

PENYEDIA JASA

CV. TONGGAK AMPUH

Jetis Pacarmulyo RT. 04 RW. 06 Kec. Leksono Wonosobo

TAHUN
2021

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA
 DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA
 PEKERJAAN : REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)
 PENYEDIA JASA : CV. TONGGAK AMPUH
 PERIODE BL. KE- : 3
 DARI TANGGAL- : 29 November 2021
 S/D TANGGAL- : 22 Desember 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOL.	SAT	PENGGUNAAN			PENYEDIAAN			SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	Batu Belah	1.198,43	M3	453,96	744,47	1.198,43	460,00	739,00	1.199,00	0,57
2	Kawat Bronjong Pabrikasi	219,75	Bh	84,75	135,00	219,75	200,00	20,00	220,00	0,25
3	Pasir Pasang	358,69	M3	115,93	242,76	358,69	140,00	219,00	359,00	0,31
4	Portland Cement (PC)	224.187,00	Kg	74.842,00	149.325,00	224.187,00	85.000,00	140.000,00	225.000,00	833,00
5	Multiflex 12 mm	280,00	Lbr	88,00	192,00	280,00	90,00	195,00	285,00	5,00
6	Kaso 5/7 cm	10,79	m3	3,40	7,39	10,79	4,00	7,00	11,00	0,21
7	Paku 5 cm dan 7 cm	170,40	Kg	53,70	116,70	170,40	55,00	116,00	171,00	0,60
8	Minyak Bekisting	154,40	Liter	48,60	105,80	154,40	52,00	103,00	155,00	0,60
9	Pasir Beton	206,43	M3	57,38	149,05	206,43	60,00	147,00	207,00	0,57
10	Batu Pecah Split 2/3	314,12	M3	87,03	227,09	314,12	95,00	220,00	315,00	0,88
11	Besi beton polos	2.577,00	Kg	1.142,00	1.435,00	2.577,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00	23,00
12	Kawat beton	36,80	Kg	16,30	20,49	36,80	20,00	17,00	37,00	0,20
13	Tanah Urug	112,81	M3	-	112,81	112,81	-	113,00	113,00	0,19
14	Bagor	85,00	M3	-	85,00	85,00	-	90,00	90,00	5,00
15	Pipa PVC AW dia.2"	21,00	M1	-	21,00	21,00	-	22,00	22,00	1,00

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Pekerja	2.207,00 hok	764,00	1.443,00	2.207,00
2	Tukang Batu	668,00 hok	248,00	420,00	668,00
3	Tukang Kayu	83,00 hok	27,00	56,00	83,00
4	Tukang Besi	18,00 hok	8,00	10,00	18,00
5	Kepala Tukang	92,00 hok	36,00	56,00	92,00
6	Mandor	112,00 hok	49,00	63,00	112,00

III. PENGGUNAAN ALAT


NO	NAMA ALAT	JUMLAH	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	Excavator	63,00 Jam	43,00	20,00	63,00
2	Jack Hammer	47,00 Jam	27,00	20,00	47,00
3	Compressor	47,00 Jam	27,00	20,00	47,00
4	Concrete Mixer	1.560,00 Jam	477,00	1.083,00	1.560,00

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	MINGGU 6	Senin, 29 November 2021 s.d Minggu, 05 Desember 2021		
2	MINGGU 7	Senin, 06 Desember 2021 s.d Minggu, 12 Desember 2021		
3	MINGGU 8	Senin, 13 Desember 2021 s.d Minggu, 19 Desember 2021		
4	MINGGU 9	Senin, 20 Desember 2021 s.d Rabu, 22 Desember 2021		
5	MINGGU			
		Lamanya hujan bulan ini		
		Lamanya hujan s/d bulan lalu		
		Lamanya hujan s/d bulan ini		

Wonosobo, 22 Desember 2021

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. UTAMA KARYA


PRASETYO ADHI, ST
Inspectore

Dibuat Oleh :
CV. TONGGAK AMPUH


MUHAMMAD WAISUL
Pelaksana

RELISAPELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

BULAN KE

TANGGAL

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

: PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IIRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IIRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

: REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI D.I DESA MRICA (343)

: KECAMATAN KALIKAJAR

: 3

: 23 November 2021

: 60 HARI KALENDER

s/d

25 Desember 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	NILAI BOBOT PEK (%)	BLN	OKT.					NOVEMBER					DESEMBER					PROGRES KET.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						MGG	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		s/d	s/d	s/d	s/d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																										5	7	7	7	7	7	7	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

MASA PEMELIHARAAN = 180

